

Управление образования администрации
муниципального района «Новооскольский район»

ЗАКЛАДКА МИНИ-ДЕНДРОПАРКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА

Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция юных натуралистов»

Гусев Александр Викторович

Новый Оскол, 2017 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



**В 20 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ИМЕЮТСЯ
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
2577,2 КВ. М.**



**В 17 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА
ИМЕЮТСЯ ПЛОДОВЫЕ САДЫ
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
1699,6 КВ. М.**




**В 21 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ РАЙОНА
ИМЕЮТСЯ ПИТОМНИКИ
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
1613,2 КВ. М.**

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К 1 мая 2018 года создать условия для комфортного пребывания не менее 2800 учащихся на территориях 21 общеобразовательного учреждения Новооскольского района
Способ достижения цели:	Реализация комплекса мероприятий по закладке мини-дендропарков на территории общеобразовательных учреждений Новооскольского района
Результат проекта:	Заложены мини-дендропарки на территории 21 общеобразовательного учреждения Новооскольского района на площади не менее 4 000 кв. м.
Требования к результату:	<ol style="list-style-type: none">1. Заложены мини-дендропарки на территории 21 общеобразовательного учреждения Новооскольского района на площади не менее 4 000 кв. м.2. Паспортизировано не менее 500 видов растений мини-дендропарков3. Составлены методические рекомендации по закладке мини-дендропарков4. Изготовлено не менее 2000 табличек для растений мини-дендропарков5. Проведен муниципальный конкурс исследовательских работ «Наш школьный дендропарк»
Пользователи результата проекта:	Учащиеся, педагоги, родители общеобразовательных учреждений Новооскольского района

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

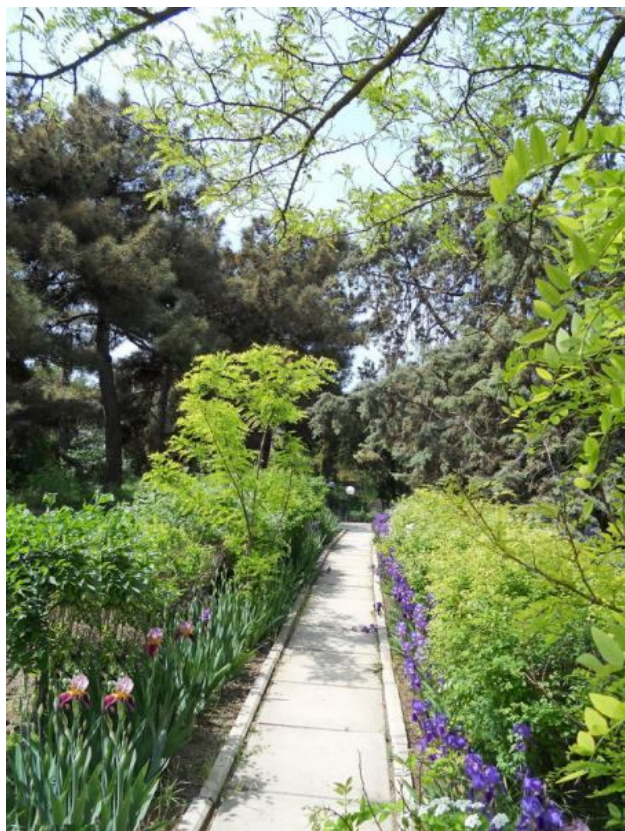

На территории 21 общеобразовательного учреждения Новооскольского района будут созданы мини-дендропарки

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год									
					03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Подготовительный этап	60	10.03.17	06.06.17										
1.1	Мониторинг состояния имеющихся в общеобразовательных учреждениях дендрологических отделов, плодовых садов и питомников	56	10.03.17	31.05.17										
1.2.	Проектировка территорий мини-дендропарков	56	10.03.17	31.05.17										
1.3.	Составление календарного плана работ	30	27.03.17	10.05.17										
1.4.	Обеспечение консультационной поддержки не менее 25 педагогов общеобразовательных учреждений по проектировке территорий мини-дендропарков, подбору видового состава растений, по составлению календарного плана работ	24	02.05.17	06.06.17										

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год						2018 год			
					06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
2	Основной этап	210	07.06.17	30.03.18										
2.1	Районный семинар по организации работы по закладке мини-дендропарков на территории общеобразовательных учреждений района.	15	07.06.17	22.06.17										
2,2.	Подбор видового состава растений для мини-дендропарков	46	13.06.17	22.08.17										
2,3.	Заготовка колевок для подвязки саженцев	30	03.07.17	11.08.17										
2,4.	Приобретение и высадка посевного материала	146	13.06.17	31.10.17										
2,5.	Разбивка участков	39	06.06.17	31.07.17										
2.6.	Подготовка почвы	146	13.06.17	31.10.17										
2.7.	Обработка приствольных кругов	146	13.06.17	31.10.17										
2.8.	Изготовление табличек	37	01.11.17	22.12.17										
2.9.	Паспортизация растений	60	08.01.18	30.03.17										

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год		
					04	05	06
3	Заключительный этап	60	10.04.18	20.06.18			
3.1	Размещение на официальном сайте управления образования и сайтах общеобразовательных учреждений информации о ходе реализации проекта	29	02.04.18	14.05.18			
3,2.	Подготовка методических рекомендаций по закладке мини-дендропарков и их содержанию	41	13.05.18	22.06.18			
3,3.	Организация и проведение муниципального конкурса исследовательских работ «Наш школьный дендропарк»	30	02.05.18	19.06.18			
3,4.	Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ	55	02.05.18	30.06.18			
4	Итого	260	10.03.17	30.06.18			

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1	Подготовительный этап								
1.1	Мониторинг состояния имеющихся в общеобразовательных учреждениях дендрологических отделов, плодовых садов и питомников								
1.2	Проектировка территорий мини-дендропарков								
1.3	Составление календарного плана работ								
1.4	Обеспечение консультационной поддержки не менее 25 педагогов общеобразовательных учреждений по проектировке территорий мини-дендропарков, подбору видового состава растений, по составлению календарного плана работ								

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
2	Основной этап								
2.1	Районный семинар по организации работы по закладке мини-дендропарков на территории общеобразовательных учреждений района.								
2,2.	Подбор видового состава растений для мини-дендропарков								
2,3.	Заготовка кольев для подвязки саженцев								
2,4.	Приобретение и высадка посевного материала				25,0				
2,5.	Разбивка участков								
2.6	Подготовка почвы								
2.7	Обработка приствольных кругов								
2.8	Изготовление табличек				25,0				
2.9	Паспортизация растений								

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
3	Заключительный этап								
3.1	Размещение на официальном сайте управления образования и сайтах общеобразовательных учреждений информации о ходе реализации проекта								
3,2	Подготовка методических рекомендаций по закладке мини-дендропарков и их содержанию								
3,3	Организация и проведение муниципального конкурса исследовательских работ «Наш школьный дендропарк»								
3,4	Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ								
Всего:		50,0			50,0				

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование			50,0
2	Земельный участок			
3	Инфраструктура			
3.1	Дороги			
3.2	Электроэнергия			
3.3	Газоснабжение			
3.4	Водоснабжение			
4	Субсидии			
5	Обеспечение			
5.1	Гарантии			
5.2	Залоги			
6	Прочие формы участия			
Итого:				50,0

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Участие населения в реализации проекта	Тыс. чел.	1,5
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	0,05
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль в проекте
1.	Богачев Виктор Алексеевич	Заместитель главы администрации района по социальной политике	Куратор проекта
2.	Нехаев Юрий Николаевич	Начальник управления образования	Руководитель проекта
3.	Гусев Александр Викторович	Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»	Администратор проекта
4.	Генрих Ирина Валерьевна	Специалист управления образования	Оператор проекта
5.	Молчанов Александр Михайлович	Заместитель начальника управления сельского хозяйства – начальник отдела биологизации земледелия и повышения эффективности использования пашни	Член рабочей группы проекта (р)
6.	Лакомова Марина Борисовна	Заместитель начальника управления образования	Член рабочей группы проекта (р)
7.	Титова Наталья Вячеславовна	Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования	Член рабочей группы проекта (р)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта: Нехаев Юрий Николаевич

Электронный адрес: <http://www.edunoskol.ru/>,

тел. 8 (47 233) 4-50-90

Администратор проекта: Гусев Александр Викторович

тел. 8 (47 233) 4-48-72
